



町健康福祉センター建設工事 今後の主な工程

令和5年1月～	<ul style="list-style-type: none"> ●耐火被覆工事 ●外壁工事 ●金属工事・防水工事 ●軽鉄下地及びボード張り ●鋼製建具工事
2月～	<ul style="list-style-type: none"> ●木工事・エレベーター工事 ●防塵塗装
3月～	<ul style="list-style-type: none"> ●内装仕上げ工事 ●器具・機器取り付け ●外部配管・給水引込
4月～	<ul style="list-style-type: none"> ●足場解体
5月～	<ul style="list-style-type: none"> ●外構工事
6月～	<ul style="list-style-type: none"> ●仕上げユニット・家具工事 ●電気・機械設備の試運転調整、受電、通水
7月～	<ul style="list-style-type: none"> ●エレベーター試運転調整
～8月	<ul style="list-style-type: none"> ●検査等を経て、建物竣工

●施設の概要や工事に関する問い合わせ先 福祉こども課 ☎ 62-2210

健康福祉センター建設工事は、現在行われている屋根や外壁、電気設備の配管配線、空調設備の内外装工事と並行して、年明けから建具の取り付けなどが始まります。

現時点での工程表では、3月に外装工事を終え、4月には建物内外の足場の解体を予定しています。

定めています。

さらに、春先からは内装の仕上げ、各種器具・機器の取り付けといった施設で業務を行うために必要な具体的な設備の設置工事が行われ、外構工事や施設の試運転などを経て、夏に建物が完成する予定です。

今年の夏完成目指す



工事進捗率 75%に



施設の完成イメージ

町の新たな健康・福祉の拠点として整備する「鏡石町健康福祉センター（愛称・ほがら館）」の建設工事が駅東地区に進められており、工事の進捗率は昨年12月末時点で75%となりました。

建設地では8月から始まった鉄骨工事が終わり、現在は施設の内外装工事が行われています。今回は主に建物内の工事の様子や、今後の工程などについてお知らせします。

町健康福祉センター建設事業



2 F

※3階は展望室

施設内の間取りと建設工事の様子

(令和4年12月13日撮影)

1 F

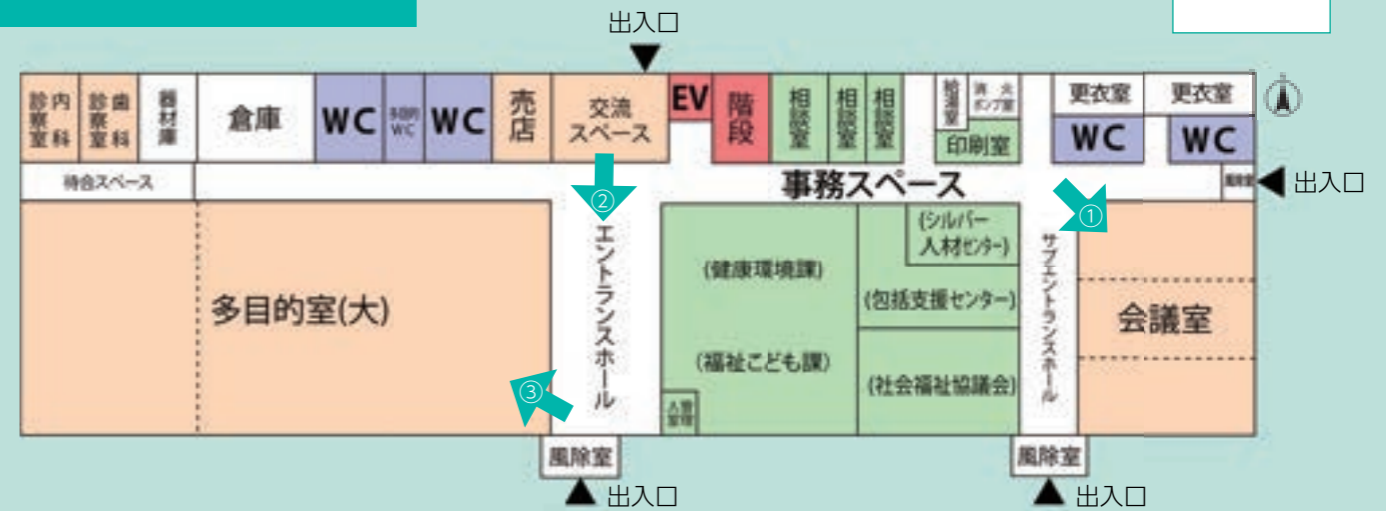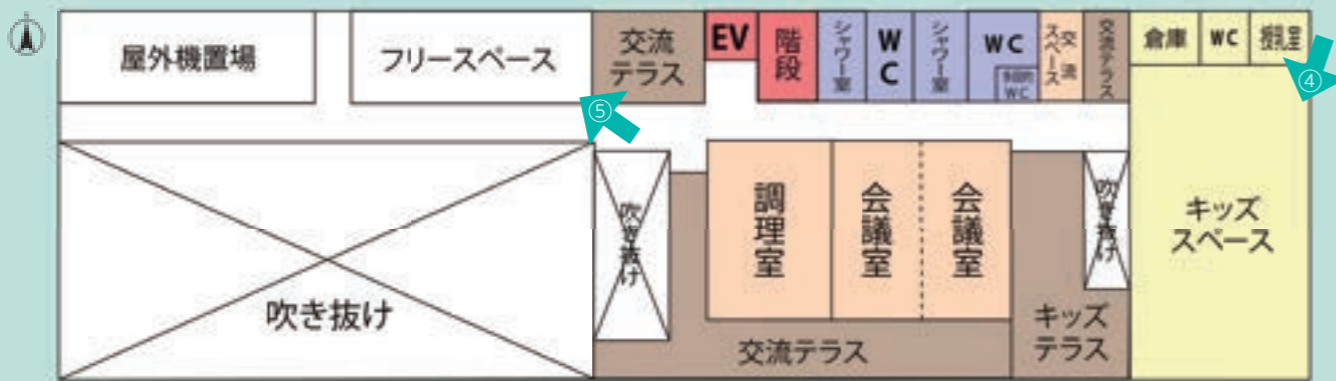

施設北側には倉庫を設置




休憩や打ち合わせ等に利用できるフリースペース



子育て世代の交流の場となるキッズスペース



約400人収容可能な多目的室(大)

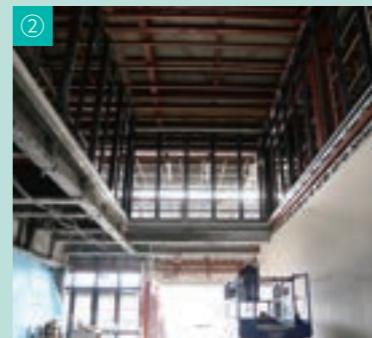

開放的なエントランスホール



用途に応じ3部屋に仕切ることができる会議室
